


112年12月核一廠除役工作進度報告

本月核一廠除役工作進度：

1. 台電公司於109年9月23日函送「核一廠汽機廠房主發電機及其附屬設備、主/輔變壓器、冷凝水泵馬達等設備拆除作業計畫」予核安會(前原能會)審查，並於110年9月30日通過審查，現正依規畫準備設備拆除作業。
2. 台電公司於111年7月7日函送「核一廠氮氣槽室內設備及管線拆除作業計畫」予核安會審查，目前核安會審查中。
3. 台電公司於111年8月3日函送「核一廠一、二號機主汽機及飼水加熱器及其附屬設備等拆除作業計畫」予核安會審查，目前核安會審查中。
4. 台電公司於111年12月2日函送「核一廠廢氣廠房內外飼水加氫產生系統設備拆除作業計畫」予核安會審查，目前核安會審查中。
5. 核一廠離廠再確認中心建置作業已於112年12月15日完成，並於112年12月22日揭牌。

台電公司正積極與新北市政府溝通協調，期望新北市能依據臺北高等行政法院112年3月16日判決，核定室外乾貯設施水保計畫。

核一廠除役計畫工作進度【預定 / 實際】趨勢圖

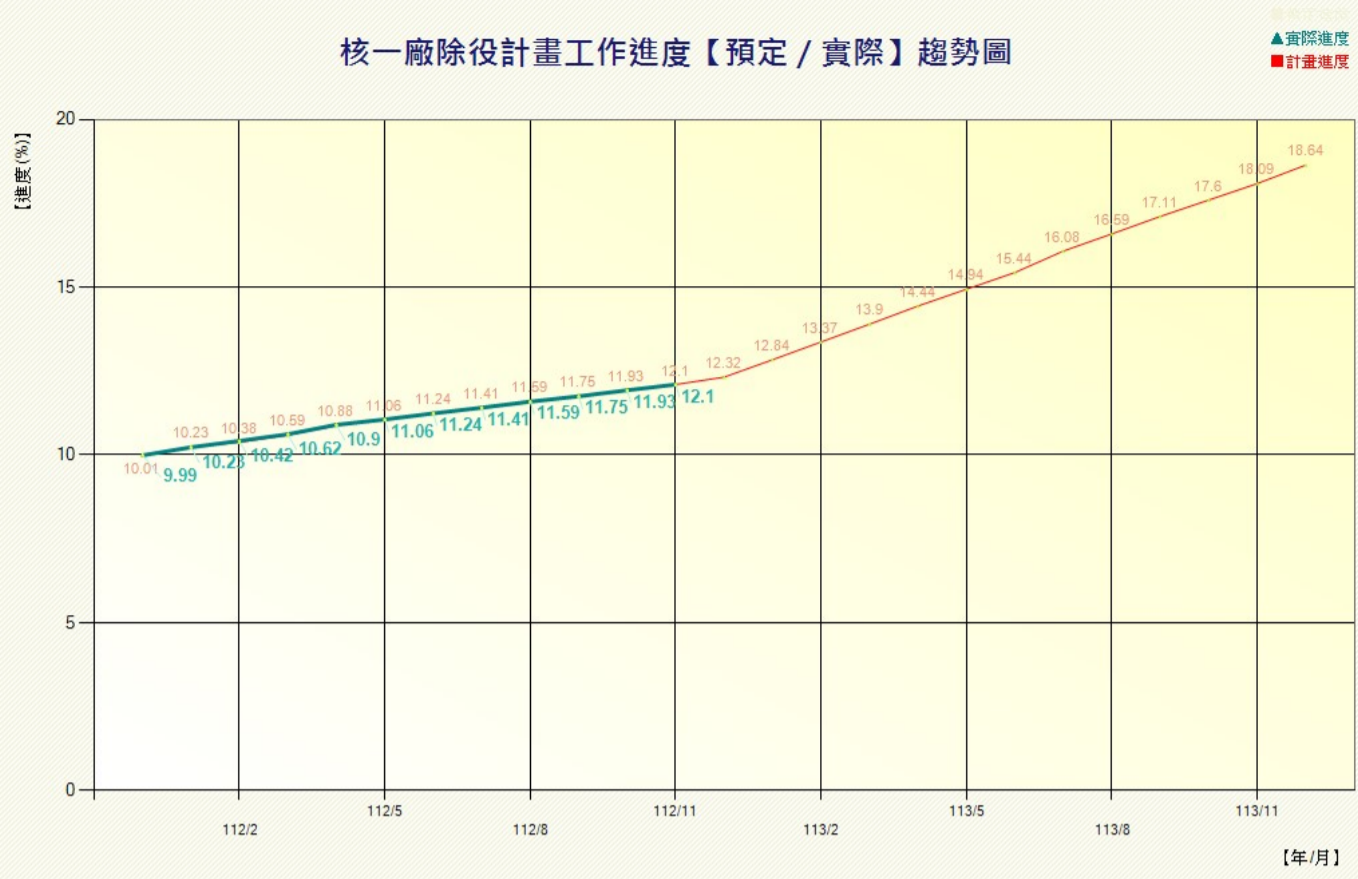

預定工程總進度：12.1% / 實際工程總進度：12.1%
