


## 110年6月核一廠除役工作進度報告

本月核一廠除役工作進度：

1. 台電公司於109年2月24日函送「二期乾貯用地地上物拆除作業方案」予原能會審查，經二回合程序審查及二回合實質審查，已於109年10月5日通過審查。現正依規畫執行設備及建物拆除作業。
2. 台電公司於109年9月23日函送「核一廠汽機廠房主發電機及其附屬設備、主/輔變壓器、冷凝水泵馬達等設備拆除作業計畫」予原能會審查，經程序審查，於109年11月24日進入實質審查。原能會於110年5月31日提出第3次審查意見，台電公司已於110年6月17日答覆原能會第3次審查意見，台電公司正積極配合原能會之審查作業，以期順利通過審查。
3. 核一廠目前正進行離廠自主確認中心建置作業，已選定由重機械廠房、28號倉庫及29號倉庫等地點建置。目前持續進行相關建物整治、儀器建置及中心制度建立與認證等作業。
4. 核一廠除役輻射特性調查偵檢計畫已於109年2月15日經原能會核備。電廠輻射特性調查作業依核備之偵檢計畫辦理，目前一號機汽機廠房、反應器廠房、廢料廠房等皆按偵檢計畫之排程及相關規範執行中。

台電公司正積極與新北市政府溝通協調，取得室外乾式貯存設施水土保持完工證明，希望能同意台電公司少量使用室外乾式貯存設施，俾利儘早移出核反應器內之用過核子燃料，以利遂行除役作業。

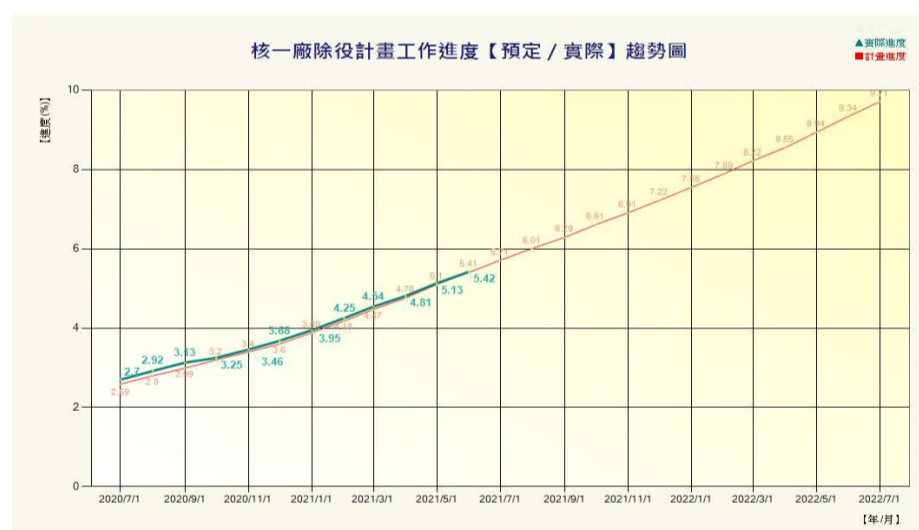

預定工程總進度：5.41% / 實際工程總進度：5.42%
