


## 110年9月核一廠除役工作進度報告

本月核一廠除役工作進度：

1. 台電公司於109年2月24日函送「二期乾貯用地地上物拆除作業方案」予原能會審查，並於109年10月5日通過審查，現正依規畫執行設備及建物拆除作業。
2. 台電公司於109年9月23日函送「核一廠汽機廠房主發電機及其附屬設備、主/輔變壓器、冷凝水泵馬達等設備拆除作業計畫」予原能會審查，並於110年9月30日通過審查，現正依規畫準備設備拆除作業。
3. 核一廠目前正進行離廠再確認中心建置作業，已選定建置於重機械廠房、28號倉庫及29號倉庫區域。目前持續進行相關建物整治、儀器建置及中心制度建立與認證等作業。
4. 核一廠除役輻射特性調查偵檢計畫已於109年2月15日經原能會核備。電廠輻射特性調查作業依核備之偵檢計畫辦理，目前一、二號機汽機廠房、反應器廠房、廢料廠房等皆按偵檢計畫之排程及相關規範執行中。

台電公司正積極與新北市政府溝通協調，取得室外乾式貯存設施水土保持完工證明，希望能同意台電公司少量使用室外乾式貯存設施，俾利儘早移出核反應器內之用過核子燃料，以利遂行除役作業。

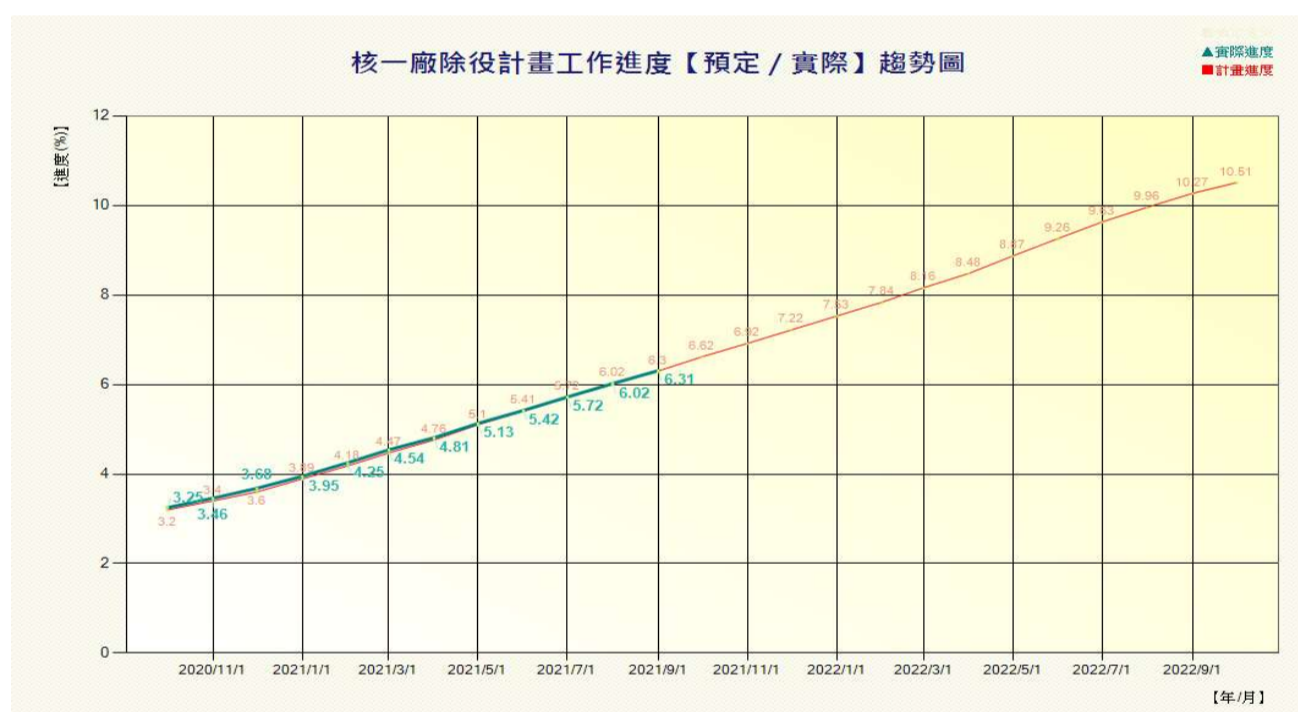

預定工程總進度：6.30% / 實際工程總進度：6.31%
